



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

REFERTO
SULL'ATTUAZIONE DEL PNRR/PNC
DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
CONTROLLO SULLA GESTIONE

(artt. 3, comma 4, della legge n. 20/94 e 7, comma 7, del D.L. 31 maggio 2021 n. 77)

Relatore: Giuseppe Di Prima



Ha collaborato:
Dott.ssa Giulia Gulli



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Ufficio II – Supporto controllo
gestione Enti locali Sicilia | Il Magistrato istruttore

Oggetto: monitoraggio al 30/06/2024 degli interventi PNRR/PNC della Città metropolitana di Palermo.

SOMMARIO

- 1. INQUADRAMENTO NORMATIVO**
- 2. PREMESSA**
- 3. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI**
 - 3.1 Avanzamento Procedurale**
 - 3.2 Avanzamento finanziario**
 - 3.3 Effetti della rimodulazione**
- 4. PROGETTI CON SOGGETTI ATTUATORI ESTERNI**
- 5. SITUAZIONE DEL PERSONALE**
- 6. ALTRE INFORMAZIONI**
- 7. VALUTAZIONI CONCLUSIVE**

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

La Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana, in continuità con l'attività di programmazione dei controlli, per l'anno 2024, di cui alla deliberazione n. 51/2024/INPR (adottata il 6 marzo 2024) e tenendo conto delle novità intervenute nel contesto normativo, svolge il controllo sulla gestione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, della l. n. 20/1994 e dell'art. 7 del d.l. n. 77/2021.

In proposito, occorre precisare che, dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 12 *quinques*, lett. b), del d.l. 22 aprile 2023, n. 44, convertito nella l. 21 giugno 2023, n. 74, che, a modifica dell'art. 22 del d.l. n. 76/2022 sul controllo concomitante, ha escluso dallo stesso controllo i piani, programmi e progetti previsti o finanziati dal PNRR o dal piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), la Sezione, in occasione della programmazione dei controlli per l'anno 2024, con la suindicata deliberazione n. 51/2024/INPR, ha reindirizzato il controllo dei predetti piani, programmi e progetti previsti o finanziati dal PNRR o dal PNC nella materia dei *"controlli successivi sulla gestione con specifica rilevanza economico-finanziaria"* ovvero nell'ambito dei controlli-referto sulla finanza locale e regionale *"da avviare in collaborazione ed in coordinamento con la Sezione Autonomie, tra i quali assume una particolare priorità "la verifica degli avanzamenti degli investimenti PNRR e PNC" e "[dell'] efficienza nella utilizzazione delle risorse del FSC, del PNRR e del PNC"*.

Con particolare riferimento al controllo sulla gestione degli interventi PNRR e PNC, la Sezione delle Autonomie, nel ritenere che *"i controlli sulla gestione non possono attendere l'esito conclusivo delle attività, che, nella maggior parte dei casi, è molto protratto nel tempo"*, ha avuto occasione di chiarire che detti controlli devono *"focalizzarsi su segmenti di gestione connessi alla realizzazione degli obiettivi intermedi"* (deliberazione n. 1/SEZAUT/2023/INPR).

In siffatto assetto normativo e giurisprudenziale la valutazione gestionale della Corte, a fronte di interventi che nella maggior parte dei casi dovrebbero giungere a completamento entro il 2026, investe il raggiungimento dei risultati intermedi e la progressione dei relativi procedimenti amministrativi da parte dei soggetti attuatori.

In particolare, il controllo sulla gestione, secondo quanto stabilito dall'art. 7 del d.l. n. 77/2021 e dall'art. 3 della l. n. 20/1994, viene svolto *"anche in corso di esercizio"*, effettuando *"valutazioni di economicità efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego"* delle relative risorse, verificando *"la legittimità e la regolarità"* dell'utilizzo delle risorse stesse e accertando *"la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge"*.

La Sezione delle Autonomie nella deliberazione riguardante il *"Contributo alla relazione ex art. 7, comma 7, D.L. 31 maggio 2021 n. 77"* (II semestre 2023) si è soffermata sulle finalità del controllo sulla gestione sui progetti del PNRR e PNC, evidenziando che *"nella legislazione dedicata al PNRR e in*

particolare, all'art 1, co. 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, viene fatto riferimento alla responsabilità delle Amministrazioni e degli organismi titolari dei progetti finanziati per l'attuazione del programma Next Generation EU «conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea (...), nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali». Inoltre, il Documento della Commissione Europea "Commission Staff Working Document Guidance to Member States Recovery and Resilience Plans" (SWD-2020 205 final) fa esplicito riferimento a tale profilo, individuando con la locuzione "sound financial management", il concetto di "sana gestione finanziaria", che ricade nel perimetro di controllo che la Corte dei conti è chiamata a garantire. L'esigenza di un'oculata programmazione e gestione della spesa è fondamentale nell'ottica di preservare la sana gestione finanziaria dell'ente" (deliberazione n.16/2023/FRG).

Nel contesto normativo e giurisprudenziale richiamato si inserisce la presente deliberazione riguardante il controllo sulla gestione nella fase di attuazione, finanziaria e procedurale, degli interventi di cui la Città metropolitana di Palermo è soggetto attuatore e/o beneficiario.

2. PREMESSA

La Sezione, in continuità con la suddetta deliberazione n. 51/2024/INPR, ha avviato attività istruttoria nel mese di giugno 2024, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti del PNRR e del PNC che vedono la Città metropolitana di Palermo in qualità di "soggetto attuatore".

Più in dettaglio, con nota prot. C.d.c. del 4 giugno 2024, n. 4398, è stato chiesto alla Città metropolitana di Palermo di fornire i dati anagrafici nonché i dati informativi sull'avanzamento procedurale e finanziario di ciascun progetto, **aggiornati al 30 giugno 2024**, attraverso la compilazione di una tabella avente lo stesso contenuto della "Tabella PNRR" approvata con la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 8/2024/INPR recante "Linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul rendiconto 2023, per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266".

In data 22 luglio 2024, al prot. C.d.c. n. 5500, è pervenuto il riscontro istruttorio della Città metropolitana di Palermo.

In data 11 ottobre 2024, con prot. C.d.c. n. 7984, questa Sezione, ai fini del contraddittorio, ha trasmesso alla Città metropolitana di Palermo gli esiti dell'attività istruttoria svolta, con invito a formulare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.

La Città ha inviato proprie osservazioni/controdeduzioni, assunte al prot. C.d.c. del 21 ottobre 2024, n. 8177.

Ciò premesso, il presente referto espone le risultanze del monitoraggio, al 30 giugno 2024, di tutti gli interventi gestiti direttamente dalla Città metropolitana di Palermo in qualità di "soggetto

attuatore” nonché degli interventi con una ricaduta finanziaria effettiva sul bilancio dell’Ente in quanto beneficiario dei finanziamenti stanziati dal PNRR (di natura esclusivamente europea dal dispositivo RRF o dei fondi del PNC) e la cui gestione è sotto il diretto controllo dell’Ente stesso o di enti strumentali o di supporto coinvolti a vario titolo nella realizzazione dei progetti e individuati dal soggetto attuatore nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente (es. in materia di appalti pubblici)¹.

Gli enti locali sono soggetti attuatori qualora provvedano direttamente alla realizzazione degli interventi, oppure soggetti beneficiari quando si avvalgono di enti strumentali o di altri soggetti, anche privati, per l’esecuzione del progetto.

Il d.l. n. 77/2021 con l’art. 10, comma 1, consente, infatti, agli enti locali titolari di fondi del PNRR di affidare le risorse di cui sono beneficiari ad altri soggetti che attuino materialmente gli interventi, tra cui società partecipate in-house qualificate ai sensi dell’art. 38 del Codice dei contratti.

In questo caso, l’amministrazione è tenuta a stipulare una convenzione con l’ente strumentale, che ne specifichi il ruolo, la responsabilità e la remunerazione.²

La Sezione ha verificato lo stato di avanzamento procedurale al 30/6/2024 degli interventi di cui la Città metropolitana di Palermo è soggetto attuatore sulla base degli esiti dell’attività istruttoria svolta e delle controdeduzioni formulate dall’Ente, assunte al succitato prot. C.d.c. del 21 ottobre 2024, n. 8177, anche consultando le relative informazioni presenti sulla piattaforma ReGiS³.

Per quanto riguarda l’avanzamento finanziario, è stato possibile accertarne l’evoluzione con riferimento ai dati al 31/12/2023, non risultando, per vari progetti, le informazioni aggiornate al 30/6/2024.

¹ L’art.9 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 (in breve d.l. n.77/2021) stabilisce che “*alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente.*”

² Il beneficiario, anche laddove non figuri come soggetto attuatore, è tenuto a monitorare lo stato di attuazione o dalla rendicontazione delle risorse, che transitano dal bilancio dell’ente. Nel momento del riparto delle risorse, viene infatti siglata una convenzione tra ministero e beneficiario, che stabilisce in dettaglio gli obblighi, tra cui quello di garantire l’attuazione del progetto nei tempi stabiliti dal cronoprogramma e la conservazione di tutta la documentazione contabile allo scopo di garantire la corretta rendicontazione.

³ Le informazioni circa gli interventi vengono monitorate attraverso ReGiS, che, come stabilisce la circolare del MEF-RGS n. 27 del 21/6/2022, è la piattaforma informatica unica alimentata dai soggetti attuatori con i dati relativi ai progetti del PNRR. La stessa circolare chiarisce che “*I soggetti Attuatori sono responsabili della corretta alimentazione del sistema ReGiS con i dati di programmazione ed attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi ai progetti di loro competenza. In particolare, provvedono, con cadenza mensile ad aggiornare i dati registrati sul sistema e renderli disponibili per le Amministrazioni titolari delle misure ai fini delle operazioni di controllo e validazione di competenza*”. Inoltre, la successiva circolare del MEF-RGS n. 29 del 26/7/2022 ha stabilito che la piattaforma ReGiS costituisce la base informativa su cui vengono registrate le varie fasi di attuazione del piano, ovvero avvio, finanziamento, stato di avanzamento dei lavori, fino alla rendicontazione finale, da parte delle Amministrazioni titolari degli interventi del PNRR.

3. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

In base agli esiti dell'attività istruttoria svolta dalla Sezione e alle controdeduzioni rese dalla Città metropolitana di Palermo, questa risulta essere soggetto attuatore di n. 28 progetti identificati mediante un Codice Unico di Progetto (CUP).

Tabella 1- Progetti PNRR e PNC suddivisi per missione e per tipologia

Intervento	n. CUP	non nativi PNRR
totale M1	2	0
totale M2	6	6
totale M4	11	11
totale M5	9	0
totale	28	17

Fonte: elaborazioni Cdc sulla base del riscontro istruttorio e delle controdeduzioni dell'Ente

Come emerge dalla superiore tabella, nella missione M4 (*"Istruzione e ricerca"*) si concentra il maggior numero di progetti, n. 11 progetti su n. 28 totali (pari al 39 per cento della totalità dei CUP): si tratta di progetti appartenenti alla tipologia *"non nativi PNRR"*, la cui origine precede il PNRR ma che sono stati poi inseriti tra i progetti finanziabili dal PNRR⁴.

N. 6 progetti, anche questi *"non nativi PNRR"*, rientrano nella missione M2 (*"Rivoluzione verde e transizione ecologica"*), n. 9 progetti nella missione M5 (*"Inclusione e coesione"*), e n. 2 progetti nella missione M1 (*"Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo"*).

Per quanto riguarda le fonti di finanziamento, la tabella che segue ne riassume l'ammontare considerando l'insieme dei progetti, aggregati per missione.

Tabella 2 - Fonti del finanziamento dei Progetti PNRR e PNC

Missione	Fondi RRF (€)	Fondi PNC (€)	FOI (€)	Fondi Ente (€)	Altri Fondi (€)	Totale (€)	%
totale M1	513.894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	513.894,26	0,45
totale M2	14.264.745,15	0,00	0,00	0,00	0,00	14.264.745,15	12,46
totale M4	40.450.370,20	0,00	569.700,00	1.497.824,51	1.652.032,50	44.169.927,21	38,59
totale M5	48.346.108,54	1.189.545,62	3.113.650,00	2.870.000,00	0,00	55.519.304,16	48,50
totali	103.575.118,15	1.189.545,62	3.683.350,00	4.367.824,51	1.652.032,50	114.467.870,78	

Fonte: elaborazioni Cdc sulla base del riscontro istruttorio e delle controdeduzioni dell'Ente

Più in particolare, i dati emersi in fase istruttoria ed in fase di controdeduzioni mostrano che gli interventi ricompresi nella missione M1 (*"Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo"*) e nella missione M2 (*"Rivoluzione verde e transizione ecologica"*) sono finanziati, in via esclusiva, da risorse provenienti dal dispositivo *"Recovery e Resilience Facility"* (RRF) ossia il fondo che finanzia il PNRR, per un ammontare complessivo pari ad euro 14.778.639,41.


⁴ Proprio perché questi progetti non sono nati nell'ambito del PNRR, occorre che nella fase di rendicontazione possano soddisfare i vincoli posti dal piano quali, per esempio, i vincoli di sostenibilità ambientale, noti con l'acronimo DNSH (Do Not Significant Harm), ovvero che non arrechino danni agli obiettivi di salvaguardia ambientale.

Nell'ambito della missione M4 (*"Istruzione e ricerca"*) al finanziamento RRF (euro 40.450.370,20) si aggiungono risorse provenienti, per euro 569.700,00, dal fondo per le opere indifferibili (FOI), per euro 1.497.824,51, dal bilancio dell'Ente e, per euro 1.652.032,50, da altre fonti pubbliche.

Nel caso della missione M5 (*"Inclusione e coesione"*), il finanziamento RRF (euro 48.346.108,54) risulta integrato da fondi provenienti dal PNC (euro 1.189.545,62), dal FOI (euro 3.113.650,00) e da risorse proprie dell'Ente (euro 2.870.000,00).

La missione M5 (*"Inclusione e coesione"*) accentra il 48,50 per cento dei fondi complessivi di cui la Città metropolitana di Palermo risulta titolare in quanto soggetto attuatore, mentre la missione M4 (*"Istruzione e ricerca"*) il 38,59 per cento.

Il grafico che segue mostra le percentuali di finanziamento considerando l'insieme dei progetti di cui la Città metropolitana di Palermo risulta essere soggetto attuatore (n. 28 progetti).

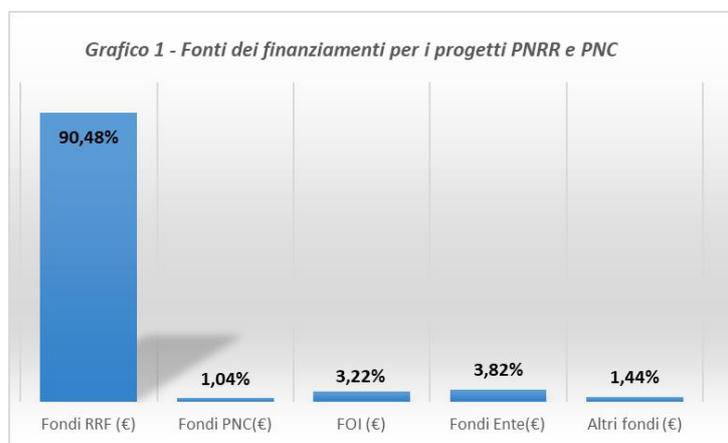

In base al superiore grafico, le risorse provenienti dal dispositivo *"Recovery and Resilience Facility"* (RRF) corrispondono al 90,48 per cento del totale, mentre le risorse del Piano Nazionale Complementare (PNC), ovvero i fondi pubblici nazionali che affiancano il PNRR e che seguono sia per la rendicontazione sia per l'attuazione le stesse procedure del PNRR, sono pari all'1,04 per cento del totale. Il resto delle risorse proviene dal fondo per le opere indifferibili (FOI)⁵ e da altri fondi

⁵ Si tratta di risorse statali stanziare per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi utilizzati nelle procedure di affidamento di opere pubbliche finanziate che una serie di fattori eccezionali di ordine geo-politico hanno reso necessario. Il comma 7, dell'art. 26, del d.l. n. 50/2022 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il *"Fondo per l'avvio di opere indifferibili"* con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026. L'art. 34, co. 1, del d.l. n. 115/2022 ha incrementato il fondo di complessivi 1.300 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 245 milioni di euro per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027. Per le assegnazioni cfr.: decreti Ragioneria generale dello Stato nn. 154-159-175-183-185-187/2023 (https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONEI/attivita_istituzionali/monitoraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/fondo_opere_indifferibili/).

pubblici, risorse che contribuiscono, rispettivamente, con il 3,22 e con l'1,44 per cento dei fondi complessivi; infine, il 3,82 per cento dei fondi sono risorse dell'Ente.

Per il dettaglio dei singoli progetti, univocamente identificati mediante il Codice Unico di Progetto (CUP), si rimanda alla tabella 9 (in calce alla relazione) dove sono elencati n. 28 progetti emersi dall'attività istruttoria svolta e dalle controdeduzioni dell'Ente.

3.1 Avanzamento Procedurale

La Sezione ha appurato lo stato di avanzamento procedurale, al 30/06/2024, di n. 28 progetti sulla base delle informazioni rese dall'Ente in sede istruttoria e in sede di controdeduzioni, raffrontandole con quelle risultanti dalla piattaforma informatica ReGiS.

All'interno della piattaforma anzidetta, l'avanzamento procedurale viene identificato mediante l'associazione nel tempo ad ogni singolo CUP di una specifica fase della sequenza dei procedimenti amministrativi, rendendone così possibile il monitoraggio.

Le possibili fasi dell'attuazione sono così definite: "Progettazione esecutiva", "Pubblicazione bando di gara", "Aggiudicazione", "Stipula contratto", "Esecuzione lavori o Esecuzione fornitura", "Collaudo".

Il soggetto attuatore è responsabile del caricamento tempestivo su ReGiS della documentazione che attesti il completamento di ciascuna fase, condizione necessaria ai fini della rendicontazione finanziaria di ciascun progetto (ad esempio, il contratto tra ente e chi esegue l'opera attesta il completamento della fase di aggiudicazione oppure il certificato di conformità dei lavori o di collaudo attesta la conclusione del progetto).

La Sezione, sulla base delle informazioni fornite dalla Città metropolitana di Palermo ha, dunque, potuto accertare l'ultima fase procedurale, con scadenza prefissata entro la data del 30/06/2024, di n. 28 progetti di cui la Città metropolitana di Palermo risulta essere soggetto attuatore.

La tabella che segue individua la fase procedurale che, da cronoprogramma, ha una data di fine prevista entro il 30/06/2024, considerando l'insieme dei progetti, aggregati per missione.

Tabella 3 - Ultima fase procedurale, con scadenza prefissata entro la data del 30/06/2024, dei progetti della Città metropolitana di Palermo

Missione	In avvio	Aggiudicazione	Stipula contratto	Esecuz. Lavori/fornitura	Collaudo	Fase N.D.	somma CUP	CUP in linea con cronoprogramma	% CUP in linea con cronoprogramma
totale M1	2						2	1	50,00%
totale M2	4			2			6	0	0,00%
totale M4	2		9				11	2	18,18%
totale M5	2	4	3				9	5	55,56%
totali	10	4	12	2	0	0	28	8	28,57%

Fonte: elaborazioni Cdc sulla base del riscontro istruttorio e delle controdeduzioni dell'Ente


In particolare, le risultanze finali del presente monitoraggio, scaturenti dall'attività istruttoria svolta e dalle controdeduzioni dell'Ente, mostrano, che, al 30/06/2024, si doveva concludere:

- per n. 10 progetti, la fase di "Avvio";
- per n. 4 progetti, la fase di "Aggiudicazione";

- per n. 12 progetti, la fase di “*Stipula contratto*”;
- per n. 5 progetti, la fase di “*Esecuzione lavori o fornitura bene/servizio*”.

Non risultano progetti aventi la fase di “*Collaudo*” in scadenza entro il 30/06/2024.

Il grafico che segue individua, in termini aggregati, l’ultima fase procedurale in scadenza entro il 30/06/2024, di n. 28 progetti della Città metropolitana di Palermo.

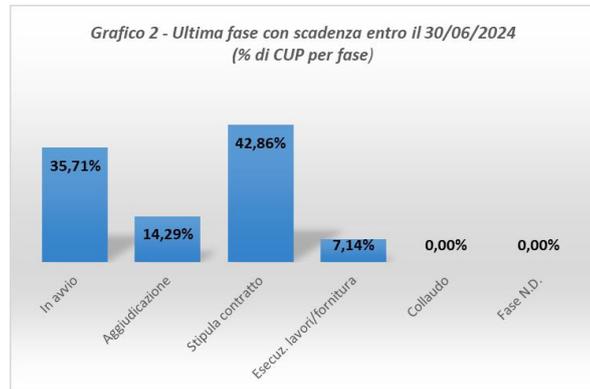

In base al superiore grafico, alla data del 30/06/2024:

- per il 36 per cento dei progetti, era prevista la conclusione della fase di “*Avvio*”;
- per il 14 per cento dei progetti, era prevista la conclusione della fase di “*Aggiudicazione*”;
- per il 43 per cento dei progetti, era prevista la conclusione della fase di “*Stipula contratto*”;
- per il 7 per cento dei progetti, era prevista la conclusione della fase di “*Esecuzione lavori o fornitura bene/servizio*”.

Per quanto riguarda il profilo temporale, come noto, gli interventi finanziati con i fondi del PNRR seguono un cronoprogramma predefinito a livello nazionale.

Questo implica che i diversi progetti si sviluppano nel rispetto della sequenza temporale all’interno della quale ciascuna fase dell’intervento deve essere completata.

Mentre il decreto del MEF del 6 agosto 2021 (“*Assegnazione delle risorse finanziarie previste per il PNRR – DM ripartizione traguardi e obiettivi*”) definisce la data entro la quale gli interventi devono essere conclusi, gli accordi operativi⁶ (“*Operational Arrangements*”) stabiliscono le scadenze delle diverse fasi di ciascun intervento del piano.

Da quanto emerso in sede istruttoria ed in sede di controdeduzioni, alla data del 30/06/2024, soltanto n. 8 progetti risultano allineati al cronoprogramma mentre n. 10 progetti risultano disallineati.

In particolare, alla data del 30/06/2024, risultano allineati al cronoprogramma:

⁶ Si tratta degli accordi che l’Italia ha condiviso con la Commissione Europea (firmati dal Ministro Franco il 23-12- 2021): https://commission.europa.eu/system/files/2021-12/countersigned_-_italy_-_rrf_-_oa_1.pdf.

- il progetto identificato con n. CUP **D77B23000150006**, con la fase di “*Monitoraggio progetto*” (ultima fase procedurale con scadenza prefissata entro il 30/06/2024) conclusasi il 30/06/2024 ovvero nella data di fine prefissata del 30/06/2024;
- il progetto identificato con n. CUP **D35B18000900002**, con la fase di “*Stipula contratto*” (ultima fase procedurale con scadenza prefissata entro il 30/06/2024) conclusasi l’8/11/2023 ovvero nella data di fine prefissata dell’8/11/2023;
- il progetto identificato con n. CUP **D95B18000950001**, con la fase di “*Stipula contratto*” (ultima fase procedurale con scadenza prefissata entro il 30/06/2024) conclusasi il 24/11/2023 ovvero nella data di fine prefissata del 24/11/2023;
- il progetto identificato con n. CUP **D23I22000000006**, con la fase di “*Stipula contratto*” (ultima fase procedurale con scadenza prefissata entro il 30/06/2024) conclusasi il 3/04/2024 ovvero entro la data di fine prefissata del 15/04/2024;
- il progetto identificato con n. CUP **D25B22000030006**, con la fase di “*Stipula contratto*” (ultima fase procedurale con scadenza prefissata entro il 30/06/2024) conclusasi il 20/03/2024 ovvero nella data di fine prefissata del 30/03/2024;
- i progetti identificati con nn. CUP **D79I22000150005**, **D71C22000070006** e **D79E22000000006**, con la fase di “*Aggiudicazione*” (ultima fase procedurale con scadenza prefissata entro il 30/06/2024) conclusasi entro la data di fine prefissata del 30/07/2023.⁷

Per quanto riguarda i progetti in ritardo, risultano disallineati rispetto al cronoprogramma procedurale alla data del 30/06/2024, i seguenti n. **10** progetti:

- il progetto identificato con n. CUP **D77H21001110001**, la cui fase di “*Stipula contratto*” (ultima fase procedurale con scadenza prefissata entro il 30/06/2024) doveva concludersi entro il 15/06/2023 e, ancora, non si è conclusa;⁸
- il progetto identificato con n. CUP **D71B21001370001**, la cui fase di “*Stipula contratto*” (ultima fase procedurale con scadenza prefissata entro il 30/06/2024) doveva concludersi entro il 12/04/2024 e si è conclusa il 22/04/2024;

⁷ Con riferimento a quest’ultimi tre progetti, la Città metropolitana di Palermo, in sede di controdeduzioni, fa sapere che “*da una verifica sui dati trasmessi si è accertato che in tutti e tre i progetti è stata comunicata la fase in corso alla data richiesta che era per l’appunto quella dell’esecuzione. La fase precedente era l’aggiudicazione di servizi o parte di essi entro il 30/07/2023 ed è stata rispettata la milestone ed i rispettivi cronoprogrammi*”.

⁸ A proposito di tale progetto, la Città metropolitana di Palermo fa sapere quanto segue: “*in attesa di sottoscrizione del contratto - verbale consegna in via d’urgenza del 28/11/2023*” aggiungendo, in sede di controdeduzioni, che “*Il Consorzio che si è aggiudicato l’appalto ha comunicato la sostituzione di un consorziato successivamente all’aggiudicazione, pertanto, è stato necessario effettuare nuovamente i controlli che erano in corso al momento della comunicazione dei dati*”;

- il progetto identificato con n. CUP **D73F20000000001**, la cui fase di “*Stipula contratto*” (ultima fase procedurale con scadenza prefissata entro il 30/06/2024) doveva concludersi entro il 15/04/2024 e si è conclusa il 30/05/2024;
- il progetto identificato con n. CUP **D55B18001540002**, la cui fase di “*Stipula contratto*” (ultima fase procedurale con scadenza prefissata entro il 30/06/2024) doveva concludersi entro il 30/04/2024 e si è conclusa il 3/05/2024;
- il progetto identificato con n. CUP **D77H21001090001**, la cui fase di “*Stipula contratto*” (ultima fase procedurale con scadenza prefissata entro il 30/06/2024) doveva concludersi entro il 15/04/2024 e si è conclusa il 29/05/2024;⁹
- il progetto identificato con n. CUP **D55B18001510002** (emerso in sede di controdeduzioni), la cui fase di “*Stipula contratto*” (ultima fase procedurale con scadenza prefissata entro il 30/06/2024) doveva concludersi entro il 3/04/2024 e si è conclusa il 12/06/2024;
- il progetto identificato con n. CUP **D71B21001380001** (emerso in sede di controdeduzioni), la cui fase di “*Stipula contratto*” (ultima fase procedurale con scadenza prefissata entro il 30/06/2024) doveva concludersi entro il 30/04/2024 e, ancora, non si è conclusa;
- il progetto identificato con n. CUP **D63G22000020006**, la cui fase di “*Aggiudicazione*” (ultima fase procedurale con scadenza prefissata entro il 30/06/2024) doveva concludersi entro il 30/01/2023 e si è conclusa il 7/08/2023;¹⁰
- il progetto identificato con n. CUP **D59D22000030006**, la cui fase di “*Progettazione definitiva – Conferenza servizi decisoria*” (ultima fase procedurale con scadenza prefissata entro il 30/06/2024) doveva concludersi entro il 10/11/2023 e si è conclusa il 13/03/2024;¹¹
- il progetto identificato con n. CUP **D78H22000180006**, la cui fase di “*Stipula contratto*” (ultima fase procedurale con scadenza prefissata entro il 30/06/2024) doveva concludersi entro il 28/06/2024 e, ancora, non si è conclusa.¹²

⁹ Rispetto ai progetti identificati con nn. CUP D71B21001370001, D73F20000000001, D55B18001540002 e D77H21001090001, la Città metropolitana di Palermo riferisce, in sede di controdeduzioni, che “*evidenziano scostamenti che vanno dai 3 ai 45 giorni che secondo quanto riferito dai rispettivi RUP nel complesso non inficiano l'andamento del cronoprogramma generale*”.

¹⁰ Con riferimento a tale progetto, la Città metropolitana di Palermo, in sede di controdeduzioni, precisa quanto segue: “*la data indicata fa riferimento all'aggiudicazione definitiva fatta da Invitalia. L'aggiudicazione provvisoria ha rispettato i termini indicati. Attualmente in fase di redazione Progettazione*”.

¹¹ In sede di controdeduzioni, l'Ente riferisce che “*lo scostamento non produce effetti sul cronoprogramma generale*”;

¹² Riguardo a tale progetto, la Città metropolitana di Palermo fa sapere che il contratto non è stato ancora stipulato “*a causa di errori nella documentazione (sono stati sostituiti dei professionisti)*” e precisa quanto segue: “*si tratta di appalto integrato, il lavoro è stato comunque consegnato sotto riserva, pertanto, la ditta sta già lavorando alla progettazione esecutiva e la stessa effettuerà i lavori. Vale la pena segnalare che tale CUP rientra tra quelli che sono fuori*

N. 9 progetti su n. 10 disallineati sono stati oggetto di rimodulazione (si rinvia al § 3.3 “Effetti della rimodulazione”).

Si osserva altresì che, con riferimento a n. 10 progetti, non è stato possibile accertarne il relativo allineamento/disallineamento, al 30/06/2024, rispetto al cronoprogramma procedurale, avendo l’Ente riferito, in relazione all’ultima fase procedurale con scadenza entro il 30/06/2024, nella prevalenza dei casi, una data di fine prevista successiva al 30/06/2024 e, in due restanti casi, l’abbreviazione “N.d.”, come dimostrato nella tabella che segue.¹³

Tabella 4 - Elenco progetti non oggetto di monitoraggio

	Missione	Missione - Componente - Investimento	CUP	Denominazione progetto	Fase procedurale con scadenza, da cronoprogramma, entro il 30/06/2024	Data fine prevista	Data fine effettiva
1	M1	M1C1I1.4.4	D744123000000006	Identità digitale Spid/CIE estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitali - SPID CIE	Predisposizione capitolato e bando di gara (in avvio)	16/07/2024	N.d.
2	M2	M2C4I3.1	D28E2000150006	"PA01 FORESTE CORLEONESI" PNRR M2C4 INV. 3.1 "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO"	Esecuzione	31/12/2026	N.d.
3	M2	M2C4I3.1	D98E22000270006	"PA02 FORESTAZIONE MONTASPRO" PNRR M2C4 INV. 3.1 "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO"	Esecuzione	31/12/2026	N.d.
4	M2	M2C4I3.1	F82F23000270006	PA01-2023 Forestazione Belmonte	PFTE (progetto di fattibilità tecnico economica) (in avvio)	30/08/2024	N.d.
5	M2	M2C4I3.1	G92F23000340006	PA02-2023 Forestazione Marineo	PFTE (progetto di fattibilità tecnico economica) (in avvio)	30/10/2024	N.d.
6	M2	M2C4I3.1	C22F23000280006	PA03-2023 Proposta progettuale finalizzata alla realizzazione di interventi di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nel contesto territoriale della Città Metropolitana di Palermo nell'ambito del PNRR	PFTE (progetto di fattibilità tecnico economica) (in avvio)	30/10/2024	N.d.
7	M2	M2C4I3.1	F82F23000300006	PA05-2023 Forestazione Belmonte 2	PFTE (progetto di fattibilità tecnico economica) (in avvio)	30/08/2024	N.d.
8	M4	M4C1I3.3	D71B21001360001	Realizzazione del nuovo corpo aule del Liceo Scientifico E. Basile di Palermo, via San Ciro n. 23, tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio 2	Monitoraggio progetto (in avvio)	N.d.	N.d.
9	M4	M4C1I3.3	D75B17002190002	Adeguamento alle norme vigenti e restauro dell'Istituto Magistrale R. Margherita di Palermo. Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, igiene e abbattimento barriere architettoniche, recupero funzionale e restauro (II° intervento funzionale)	Monitoraggio progetto (in avvio)	N.d.	N.d.
10	M5	M5C2I2.2	D73C22000280006	Progetto di riqualificazione e riuso dell'immobile denominato Palazzetto Orlando, sito in Palermo corso Calatafimi, per l'utilizzo come centro polifunzionale a servizio delle istituzioni scolastiche e del territorio.	Progettazione Definitiva - Esecutiva	31/07/2024	N.d.

Fonte: elaborazioni Cdc sulla base del riscontro istruttorio e delle controdeduzioni dell'Ente

usciti dalla quota PNRR e presenta infatti la nuova scadenza a Marzo 2027”. In merito all’appalto integrato, l’Ente osserva che “capovolge spesso la visuale sullo stato di attuazione dei progetti, perché anche se di base la gara è aggiudicata di fatto ci si trova in effetti ancora in fase di progettazione. Questo è ancora più vero per i numerosi progetti afferenti alla misura M5C2I2.2 le cui gare sono state espletate quasi tutte da Invitalia un anno prima dell’avvio di tutte le fasi di progettazione al fine di rispettare la milestone che prevedeva l’aggiudicazione dei lavori al 30/07/2023”.

¹³ Con riferimento al progetto identificato con n. CUP D71B21001360001, la Città metropolitana di Palermo riferisce che “non avendo rispettato la milestone di aggiudicazione dei lavori fissata al 31 Agosto 2023 e spostata al 30 Settembre 2023, è in fase di definanziamento come comunicato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con nota prot. 57494 del 18/07/2024”.

Preme osservare che, con riguardo ai predetti dieci progetti, su ReGiS risultano informazioni discordanti con la conseguenza che non è stato possibile conciliare le informazioni rese dall'Ente in sede istruttoria e in sede di controdeduzioni con le corrispondenti informazioni che l'Ente stesso risulta aver caricato su ReGiS.

Conclusivamente, la Sezione rileva come, in base alle informazioni fornite dall'Ente in sede istruttoria ed in sede di controdeduzioni, circa il 36 per cento dei progetti della Città metropolitana di Palermo (n. 10 progetti su n. 28 totali) risulta, alla data del 30/06/2024, in ritardo rispetto al cronoprogramma procedurale mentre soltanto il 28,6 per cento dei progetti risulta allineato al cronoprogramma procedurale.

Per il dettaglio circa lo stato di attuazione procedurale al 30/06/2024 di ogni singolo progetto, si rimanda alla tabella 10 (in calce alla relazione), dove viene indicata l'ultima fase procedurale in scadenza al 30/06/2024 e il relativo allineamento/disallineamento rispetto a tale fase, tenuto conto degli esiti dell'attività istruttoria svolta e delle controdeduzioni dell'Ente.

3.2 Avanzamento finanziario

Con la nota istruttoria prot. C.d.c. del 4 giugno 2024, n. 4398, questa Sezione ha chiesto alla Città metropolitana di Palermo, per ciascun progetto identificato mediante CUP, di indicare l'ammontare complessivo degli accertamenti, degli impegni e dei pagamenti effettuati al 31/12/2023 ed il relativo aggiornamento al 30/06/2024.

In merito agli accertamenti, va richiamata la disposizione contenuta nell'art. 15 del d.l. n. 77/2021 la quale, al fine di accelerare l'avvio degli interventi, ha previsto che gli enti attuatori possano accertare nel loro bilancio le risorse finanziarie che sono loro attribuite dal PNRR su specifici capitoli di spesa, già dalla data del decreto o atto di riparto, ovvero, ancora prima che le risorse risultino impegnate dall'amministrazione centrale titolare dell'intervento. Questa norma ha consentito di derogare alle regole ordinarie fissate dal principio contabile applicato 4/2 allegato al d.lgs. n. 118/2011, anticipando il momento in cui diviene possibile contabilizzare l'accertamento in entrata necessario alla copertura finanziaria della correlata spesa.

Inoltre, poiché nel PNRR l'avvio dei progetti precede il finanziamento, per gli enti che non abbiano capienza finanziaria sufficiente per avviare gli investimenti, il d.l. n. 152/2021, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose"*, prevede all'art. 9, commi 6 e 7, la possibilità di disporre di anticipi di liquidità (nella misura del 10 per cento delle risorse complessive assegnate) su un fondo di rotazione del MEF a gestione speciale da destinare ai soggetti attuatori dei progetti, sulla base di motivate richieste presentate dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi ricompresi nel PNRR. La contabilizzazione di

questi anticipi è normata dal comma 6 dello stesso articolo dove si legge: “per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR”.

A questo proposito, con la nota istruttoria di questa Sezione è stato richiesto alla Città metropolitana di Palermo di indicare pure l’ammontare delle anticipazioni PNRR ricevute.

L’Ente ha riscontrato, dapprima, in sede istruttoria e, poi, in sede di controdeduzioni con riferimento agli ulteriori n. 8 progetti risultanti da ReGiS, le richieste della Sezione fornendo informazioni relative allo stato di avanzamento finanziario di ciascun progetto alla data del 31/12/2023; per quanto riguarda l’aggiornamento al 30/06/2024, per vari progetti, tuttavia, non risulta, nell’apposito spazio, la relativa informazione.

Per uniformità espositiva, pertanto, la tabella che segue espone, in forma aggregata per missione, l’ammontare complessivo delle anticipazioni, degli accertamenti, degli impegni e dei pagamenti contabilizzati dall’Ente al 31/12/2023.

Tabella 5 - Anticipazioni, accertamenti, impegni e pagamenti al 31/12/2023

Missione - Componente - Investimento	N. CUP	Totale finanziamento (€)	Anticipazione (€)	Accertamenti (€)	Impegni (€)	Pagamenti (€)	Pagamenti su accertamenti (%)
totale M1	2	513.894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale M2	6	14.264.745,15	624.914,21	1.579.852,35	1.440.166,21	44.251,98	0,03
totale M4	11	44.169.927,21	7.427.874,04	31.330.247,58	31.494.277,06	683.745,72	0,02
totale M5	9	55.519.304,16	4.953.565,42	27.704.576,29	27.879.469,58	827.309,75	0,03
totali	28	114.467.870,78	13.006.353,67	60.614.676,22	60.813.912,85	1.555.307,45	0,03

Fonte: elaborazioni Cdc sulla base del riscontro istruttorio e delle controdeduzioni dell’Ente

Come già esposto nel § 3, il finanziamento totale, ovvero le risorse a disposizione della Città metropolitana di Palermo per attuare i progetti del PNRR, sono costituite dalla somma dei fondi RRF e PNC, da altri finanziamenti pubblici, tra cui gli stanziamenti del FOI, e dai fondi tratti dal bilancio dell’Ente.

In particolare, in base a quanto emerge dal riscontro istruttorio e dalle controdeduzioni, le risorse complessivamente accertate dall’Ente rappresentano solo una parte del finanziamento totale. Si registra, infatti, al 31/12/2023, una percentuale di accertato pari ad euro 60.614.676,22 ovvero il 53 per cento del finanziamento totale (euro 114.467.870,78).

Le anticipazioni ammontano ad euro 13.006.353,67 e costituiscono l’11 per cento delle risorse finanziate. Queste sono risorse richieste dalla Città metropolitana di Palermo a valere sul fondo di rotazione del MEF per un importo massimo del 10 per cento del costo del singolo intervento, anche se in casi eccezionali, debitamente motivati, è stato possibile incrementare la quota di anticipazione.

Con riferimento ai pagamenti al 31/12/2023, complessivamente pari ad euro 1.555.307,45, si osserva una percentuale molto bassa in rapporto al totale degli accertamenti (euro 60.614.676,22): nello specifico, i pagamenti, al 31/12/2023, costituiscono il 3 per cento delle risorse accertate al 31/12/2023.

3.3 Effetti della rimodulazione

In considerazione delle modifiche intervenute rispetto all'originaria configurazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con la nota istruttoria prot. C.d.c. del 4 giugno 2024, n. 4398, questa Sezione ha chiesto alla Città metropolitana di Palermo di comunicare, per ciascun intervento identificato da un CUP, se il costo del progetto ha subito rimodulazioni e, in caso affermativo, di spiegarne la motivazione.¹⁴

La seguente tabella riassume quanto emerso dal riscontro istruttorio e dalle controdeduzioni dell'Ente circa gli interventi e gli importi coinvolti.

Missione -Componente - Investimento	n. CUP	Fondi RRF (€)	Fondi PNC (€)	Somma RRF e PNC (€)
totale M2	2	6.249.142,14	0,00	6.249.142,14
totale M4	8	22.312.370,20	0,00	22.312.370,20
totale M5	6	42.474.913,87	1.045.086,13	43.520.000,00
totali	16	71.036.426,21	1.045.086,13	72.081.512,34

Fonte: elaborazioni Cdc sulla base del riscontro istruttorio e delle controdeduzioni dell'Ente

Dagli elementi conoscitivi acquisiti emerge che i progetti coinvolti dalla rimodulazione sono complessivamente n. 16 progetti, di cui n. 2 progetti rientranti nella missione M2 (*"Rivoluzione verde e transizione ecologica"*), n. 8 progetti ricompresi nella missione M4 (*"Istruzione e ricerca"*) e n. 6 progetti nella missione M5 (*"Inclusione e coesione"*).

L'importo interessato dalla rimodulazione è pari ad euro 71.036.426,21 provenienti dal dispositivo *"Recovery e resilience Facility"* (RRF) ed euro 1.045.086,13 provenienti dal PNC, per un totale di euro 72.081.512,34, ovvero circa il 69 per cento se rapportati all'importo complessivo di fondi RRF e PNC che finanziano l'insieme dei progetti di cui l'Ente è soggetto attuatore (nello specifico, euro 104.764.663,77 che finanziano n. 28 progetti).

Dal riscontro istruttorio si ricava che, per alcuni progetti, la rimodulazione è stata determinata dall'aumento dei prezzi; tale aumento ha riguardato i progetti identificati dal n. CUP D23I22000000006 e n. CUP D25B22000030006.

¹⁴ In merito alla rimodulazione del PNRR, si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, d.l. 2/3/2024, n. 19, convertito con l. 29/4/2024, n. 56 (G.U. n. 100 del 30/4/2024 - Suppl. Ordo. N. 19): *"Al fine di garantire una più efficiente e coordinata utilizzazione delle risorse europee e del bilancio dello Stato e consentire la tempestiva realizzazione degli investimenti stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nel rispetto dei traguardi e degli obiettivi previsti dallo stesso Piano, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 2.911 milioni di euro per l'anno 2024, 3.973 milioni di euro per l'anno 2025 e 2.536 milioni di euro per l'anno 2026. Per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, è autorizzata la spesa complessiva di 684 milioni di euro per l'anno 2024, di 785 milioni di euro per l'anno 2025, di 765 milioni di euro per l'anno 2026, di 548,8 milioni di euro per l'anno 2027, di 400 milioni di euro per l'anno 2028 e di 260 milioni di euro per l'anno 2029"*.

La tabella che segue individua l'ultima fase procedurale, con scadenza prefissata entro il 30/06/2024, di n. 16 progetti rimodulati della Città metropolitana di Palermo.

Tabella 7 - Avanzamento procedurale al 30/06/2024 dei progetti rimodulati

Missione - Componente - Investimento	n. CUP	In avvio	Aggiudicazione	Stipula contratto	Esecuz. Lavori/ fornitura	Collaudo	Fase N.D.
totale M2	2				2		
totale M4	8	1		7			
totale M5	6	2	1	3			
totali	16	3	1	10	2	0	0

Fonte: elaborazioni Cdc sulla base del riscontro istruttorio e delle controdeduzioni dell'Ente

I dati emersi dal riscontro istruttorio e dalle controdeduzioni, aggregati per missione, mostrano che, alla data del 30/06/2024, doveva concludersi:

- per n. 3 progetti, la fase di "Avvio";
- per n. 1 progetto, la fase di "Aggiudicazione";
- per n. 10 progetti, la fase di "Stipula contratto";
- per n. 2 progetti, la fase di "Esecuzione lavori e/o fornitura beni/servizi".

Non risultano progetti rimodulati aventi la fase di "Collaudo" in scadenza entro il 30/06/2024.

Per quanto riguarda il rispetto del cronoprogramma di questi interventi, alla data del 30/06/2024, risultano n. 9 progetti su n. 16 totali non allineati al cronoprogramma, ovvero il 56 per cento della totalità dei progetti rimodulati.

Con riferimento al progetto identificato con n. CUP D75B17002190002, emerso in sede di controdeduzioni, si osserva che non è stato possibile accertarne il relativo allineamento/disallineamento al 30/06/2024, rispetto al cronoprogramma procedurale, non avendo l'Ente fornito risposte puntuali alle richieste istruttorie. Più precisamente, la Città metropolitana di Palermo sembrerebbe riferire una scadenza della fase di "monitoraggio progetto" al 30/06/2024 "come da linee guida" per poi precisare l'assenza di scadenza per il 2024.

Infine, rileva osservare come n. 5 progetti coinvolti dalla rimodulazione risultano aver beneficiato, per un importo complessivo di euro 3.179.550,00, del contributo del fondo per le opere indifferibili (FOI), istituito dall'art. 26, comma 7, del d.l. 50/2022, finalizzato a consentire l'avvio entro il 31 dicembre 2022 delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi del PNRR.

4. PROGETTI CON SOGGETTI ATTUATORI ESTERNI

In base alle controdeduzioni, la Città Metropolitana di Palermo risulta essere soggetto beneficiario di n. 48 progetti, ricompresi nella linea di intervento M5C2I2.2 *“Piani Urbani Integrati”*, per un ammontare complessivo pari ad euro 146.641.637,84 (v. tabella 8).

Come noto, tale linea di intervento prevede che la realizzazione dei progetti sia rimessa ad un soggetto esterno che assume la veste di soggetto attuatore e che la Città metropolitana ricopra la qualifica di ente capofila del progetto.

In relazione ai predetti progetti, facenti parte del Piano Urbano denominato *“Palermo PIU: Città Aperta Città per tutti”*, la Città metropolitana di Palermo riferisce quanto segue: *“Città Metropolitana di Palermo è beneficiaria del finanziamento che include tutti i progetti inclusi nel Piano Urbano integrato nella Misura M5C2I.2.2, nella fattispecie, solo i progetti di cui l’Ente è Soggetto attuatore hanno ricadute finanziarie sul bilancio dell’Ente. I soggetti attuatori degli altri progetti compresi nel PUI intrattengono a livello finanziario rapporti diretti con il MEF e il Ministero dell’Interno sia per le rendicontazioni che per i trasferimenti. Infatti, questo Ente non può intervenire nella gestione ReGis dei progetti in questione, sebbene ne sia stata richiesta almeno la visualizzazione al fine di rendere più agevoli le operazioni di supporto e monitoraggio”*. Prosegue, precisando di aver svolto, al 30/06/2024, *“la propria attività di monitoraggio di concerto con il MEF ed il Ministero dell’Interno in occasione dell’emanazione del DL 19/2024 che ha determinato lo scostamento dei cronoprogrammi di alcuni progetti che sono fuori usciti dalla fonte di finanziamento PNRR. Tutti i progetti in questione pur autorizzati a scostare la data di termine dall’originaria del 30/06/2026 restano dentro il PUI e devono attenersi al nuovo cronoprogramma”*. Allega, infine, un documento dal quale si desume la nuova mappatura del PUI.

Tabella 8 - Elenco progetti di cui la Città metropolitana di Palermo è soggetto beneficiario - Intervento "Palermo PIU: Città Aperta Città per tutti"

Missione - Componente - Investimento	CUP	Soggetto Attuatore	Costo ammesso
M5C2I2.2	I61E17000590006	COMUNE DI VILLABATE	4.999.970,26
	D79J21017590006	COMUNE DI PALERMO	4.999.827,00
	D79J22000630006	COMUNE DI PALERMO	12.015.209,17
	D79J22000640006	COMUNE DI PALERMO	16.129.859,83
	D79J22000660007	COMUNE DI PALERMO	894.487,35
	D79J22000650006	COMUNE DI PALERMO	13.730.531,00
	B59J22000520006	COMUNE DI BAGHERIA	12.000.000,00
	B57H22000190006	COMUNE DI BAGHERIA	8.000.000,00
	C96D11000160006	COMUNE DI TRABIA	1.610.000,00
	D88I22000030001	COMUNE DI PARTINICO	1.700.000,00
	D89J22000540001	COMUNE DI PARTINICO	1.500.000,00
	D89J22000550001	COMUNE DI PARTINICO	1.100.000,00
	D83D22000190001	COMUNE DI PARTINICO	2.700.000,00
	H74E22000190006	COMUNE DI FICARAZZI	4.900.000,00
	D21B22000120006	COMUNE DI CARINI	9.402.000,00
	D22C22000330004	COMUNE DI CARINI	277.400,00
	D21B22000130006	COMUNE DI CARINI	320.600,00
	J27H22000380006	COMUNE DI MISILMERI	3.600.000,00
	J27H22000390006	COMUNE DI MISILMERI	1.700.000,00
	J27H22000400006	COMUNE DI MISILMERI	700.000,00
	J92H22000670005	COMUNE DI CERDA	1.600.000,00
	I39J22000370006	COMUNE DI MONREALE	4.641.571,00
	I37H22000100006	COMUNE DI MONREALE	1.096.048,00
	I33D22000000006	COMUNE DI MONREALE	624.406,00
	I39J22000380006	COMUNE DI MONREALE	1.151.284,00
	I31B22000050006	COMUNE DI MONREALE	2.486.691,00
	D99J22000380001	COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO	1.241.044,80
	C87H22000050006	COMUNE DI SAN CIPIRRELLO	2.250.000,00
	C13D22000020006	COMUNE DI CAPACI	1.062.813,80
	C13D22000000006	COMUNE DI CAPACI	980.184,92
	C11B22000390006	COMUNE DI CAPACI	1.159.524,16
	C11B22000400006	COMUNE DI CAPACI	432.633,27
	C11B22000420006	COMUNE DI CAPACI	339.316,12
	G37H22000070006	COMUNE DI SANTA FLAVIA	812.236,16
	J43D22000040006	COMUNE DI MONTELEPRE	250.000,00
	J43D22000020006	COMUNE DI MONTELEPRE	1.554.000,00
	J43D22000030006	COMUNE DI MONTELEPRE	490.000,00
	B67H22000090006	COMUNE DI BALESTRATE	1.300.000,00
	B67H22000080006	COMUNE DI BALESTRATE	700.000,00
	G37H22000050006	COMUNE DI BORGETTO	700.000,00
	E41B20001910006	COMUNE DI CASTELDACCIA	2.750.000,00
	E48I20000230006	COMUNE DI CASTELDACCIA	2.250.000,00
	E63D22000100006	COMUNE DI TERMINI IMERESE	3.500.000,00
	E69J22000480006	COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE	3.500.000,00
	B81B22000740001	COMUNE DI TORRETTA	1.500.000,00
J48I21000100005	COMUNE DI ALTOFONTE	1.600.000,00	
J44C15000000001	COMUNE DI ALTOFONTE	3.400.000,00	
E13D22000060005	COMUNE DI BOLOGNETTA	990.000,00	
Totale			146.641.637,84

Fonte: elaborazioni Cdc sulla base delle controdeduzioni dell'Ente

Infine, per la realizzazione dei progetti indentificati con nn. CUP D63G22000020006, D23I22000000006, D25B22000030006, D59D22000030006, D78H22000180006 e D73C22000280006, l'Ente dichiara di essersi avvalso di un ente strumentale, nello specifico di Invitalia, nella qualità di centrale di committenza.

5. SITUAZIONE DEL PERSONALE

In riferimento all'attuazione e alla rendicontazione dei progetti PNRR/PNC, da quanto emerge dal riscontro istruttorio e dalle controdeduzioni, la Città metropolitana di Palermo ha riscontrato difficoltà dovute, nella quasi totalità dei progetti, a carenze di personale.

6. ALTRE INFORMAZIONI

Nella tabella che segue si schematizzano le informazioni rese dall'Ente in sede di controdeduzioni, relativamente a procedure di gara, soggetti aggiudicatari ed incarichi esterni.

Codice Misura	CUP	Descrizione	Procedure di gara, soggetti aggiudicatari, eventuali incarichi esterni
M1C3I 1.2	D77B2300015 0006	Loggiato dell'ex Ospedale San Bartolomeo Palermo Corso Vittorio Emanuele Rimozione Barriere fisiche, cognitive e sensoriali	Servizio di ingegneria e architettura per la progettazione, calcoli statici e dimensionamento della struttura in acciaio del nuovo ascensore - Arch. Ing. Giuseppe Cerami, con sede in Palermo – P. IVA 05432170826 – affidamento diretto – MEPA
M1C1I 1.4.4	D74I2300000 0006	1.4.4P_PACittà Metropolitana di Palermo	Affidamento diretto alla società in house CSI Piemonte – Consorzio per il Sistema Informativo Corso Unione Sovietica, 216 10134 Torino in data 13 luglio 2024 P.Iva 01995120019
M1C1I 1.4.2	D54F240003 20006	Progetto Citizen Inclusion Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali (PNRR sub investimento M1C1, Asse 1, Investimento 1.4.2)	Affidamento diretto alla società in house CSI Piemonte – Consorzio per il Sistema Informativo Corso Unione Sovietica, 216 10134 Torino in data 18 settembre 2024 P.Iva 01995120019
M2C4I 3.1	D28E2000150 006	PA01 Foreste Corleonesi	Convenzione con il Dipartimento regionale sviluppo rurale e territoriale; - Affidamento diretto per la fornitura di piante relative al progetto "PA 01 -Foreste Corleonesi" € 2.920,50; Affidamento per il servizio di Collaudo Tecnico Amministrativo al Dott. Agronomo Domenico Madonia € 4.992; Affidamento per il servizio di Direzione Lavori inerente l'intervento "PA 01 – Foreste Corleonesi" al Dott. Agr. Salvatore Fiore € 48.959,5; Affidamento per il servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (CSP-CSE) inerente l'intervento "PA 01 – Foreste Corleonesi" all'Arch. Filippo Bartoli € 33.259,94; Affidamento per il servizio di Consulenza Naturalistica, inerente l'intervento "PA 01 – Foreste Corleonesi" - al Dott. Bruno Massa € 2.000; Affidamento per il servizio di Consulenza Forestale inerente l'intervento "PA 01 – Foreste Corleonesi" - al Dott. Stefano Morici € 2.000; Affidamento per il servizio di Consulenza Forestale, inerente l'intervento "PA 01 – Foreste Corleonesi" - alla Dott.ssa Rosa Moscato € 3.120; Affidamento per il servizio di Consulenza Ecologica, inerente l'intervento "PA 01 – Foreste Corleonesi" - al Dott. Silvano Riggio € 2.000; Affidamento per il servizio di Consulenza Botanica, inerente l'intervento "PA 01 – Foreste Corleonesi" - al Dott. Giuseppe Venturella € 2.000; Affidamento per il servizio di Coordinamento Gruppo di lavoro inerente l'intervento "PA 01 – Foreste Corleonesi" - al Dott. Agr. Francesco Maria Raimondo € 4.646; Affidamento per il servizio di Consulenza Cartografica inerente l'intervento "PA 01 – Foreste Corleonesi" - all'Arch. Nicolò Barcia € 3.500; Affidamento per il servizio di Consulenza Agronomica inerente l'intervento "PA 01 – Foreste Corleonesi" - al Dott. Agr. Vincenzo Gambino € 1.500; Affidamento per il servizio di Consulenza Geologica inerente l'intervento "PA 01 – Foreste Corleonesi" - CUPD28E22000150006 al Dott. Geol. Giovanni Caldarella € 1.500;
M2C4I 3.1	D98E2200027 0006	PA02 Forestazione Montaspro	Affidamento diretto per la fornitura di piante relative al progetto "PA 02 – Forestazione Montaspro" € 9.091,50; - Affidamento per il servizio di Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva e Coordinamento Gruppo di lavoro inerente l'intervento "PA 02 – Forestazione Montaspro" - al Dott. Agr. Francesco Maria Raimondo € 133.931,23; Affidamento per il servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase d'Esecuzione inerente l'intervento "PA 02 Forestazione Montaspro" all'Arch. Giovanni Raimondo € 110.572,18; Affidamento per il servizio di Collaudo Tecnico Amministrativo inerente l'intervento "PA 02 Forestazione Montaspro"; Al Dott. Agr. Domenico Madonia € 9.360; Affidamento per il servizio di Consulenza Forestale inerente l'intervento "PA 02 Forestazione Montaspro" - al Dott. Filippo Salerno € 2.080; Affidamento per il servizio di Consulenza Forestale inerente l'intervento "PA 02 – Forestazione Montaspro" alla Dott.ssa Alessia Maria Rosaria Gullotti € 3.000; Affidamento per il servizio di Consulenza Forestale inerente l'intervento "PA 02 – Forestazione Montaspro" - al Dott. Stefano Moric € 4.000; Affidamento per il servizio di Consulenza Botanica inerente l'intervento "PA 02 – Forestazione Montaspro" - al Prof. Giuseppe Venturella € 4.000; Affidamento per il servizio di Consulenza Ecologica inerente l'intervento "PA 02 – Forestazione Montaspro" - al Prof. Riggio Silvano € 3.000; Affidamento per il servizio di Consulenza Naturalistica inerente l'intervento "PA 02 – Forestazione Montaspro" - al Dott. Agronomo Bruno Massa € 3.000;

M5C2I 2.2.C	D63G220000 20006	Intervento di riqualificazione funzionale ed efficientamento energetico degli immobili esistenti nel comprensorio denominato Floriopoli territorio di Termini Imerese	Adesione ad AQ Invalitalia per servizi tecnici e lavori: - AICOM S.P.A. (Mandataria) – GHEA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L. (Mandanti) (P.IVA02144650484) - Consorzio Valori scrl con sede in Roma nella via Degli Scipioni n°153 (P. IVA 08066951008) - Affidamento servizio di ingegneria ed architettura per le attività di supporto tecnico del R.U.P con D. D. 5378 del 12/12/2022 – Affidamento diretto MEPA; - Approvazione progetto per le “Indagini sui materiali delle strutture” Importo complessivo € 115.774,68 Affidamento all’O. E. “Geolab srl” - D. D. 6121 del 28/12/2023 - Affidamento diretto MEPA; Approvazione progetto per i “Sondaggi geognostici, analisi di laboratorio geotecnico e prove geofisiche” Importo complessivo € 102.334,24 Affidamento all’O. E. “Geoservice srl” con D. D. 6120 del 28/12/2023 - Affidamento diretto MEPA;
M5C2I 2.2	D23I2200000 0006	Riqualificazione ed efficientamento energetico della struttura alberghiera Vincenzina La Fata e del centro tecnico Vito Ales di Piana degli Albanesi	Adesione ad AQ Invalitalia per lavori: Valori Scarl Consorzio Stabile Partita IVA 08066951008 - determinazione amministratore unico della Varoli Scarl assegnazione all’impresa EMMECCI srl del ruolo di impresa affidataria; - incarico per la V.Inc.A affidamento diretto a Gionanni Landro (contratto del 14/11/2022 -fatt. 9 del 07/12/2022 di € 7.358,46) incarico DD 4582 del 03/11/2022 liquidazione DD 5737 del 20/12/2022; - Incarico consulente impianti meccanici a fluido affidamento diretto a Alba Progetti Srl (contratto del 15/11/2022 -fatt. 2 del 11/02/2023 di € 17.652,52 lordo) – incarico DD 4658 del 07/11/2022 liquidazione DD 752 del 20/02/2023; - Incarico coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione affidamento diretto a Antonino Clementi (contratto del 23/11/2022 -fatt. 7 del 24/04/2022 di € 17.432,13) incarico DD 4594 del 03/11/2022; incarico professionale di consulenza e assistenza alla DL per la realizzazione degli impianti meccanici - affidamento diretto a Alba Progetti Srl (DD 2049 del 10/05/2024) per € 23.041,00 lordi – contratto del 17/05/2024; - incarico coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione – affidamento diretto Ing. A. Clementi (DD 2047 del 10/05/2024) per € 29.897,13 lordi – contratto del 16/05/2024; - nomina collaudatore tecnico amministrativo in corso d’opera all’Ing. Silvana La Gattuta – DD 2164 del 16/05/2024; Progettazione interna
M5C2I 2.2	D25B2200003 0006	Realizzazione di un parco con percorsi natura nelle aree di pertinenza del centro tecnico di canoa e canottaggio Vito Ales nel bacino artificiale di Piana degli Albanesi	Adesione ad AQ Invalitalia per lavori: Edilzeta SpA P.I.: 07662361000; - Incarico per la V.Inc.A (Valutazione incidenza ambientale) affidamento diretto al Dr. Giovanni Landro (D.D. affidamento n. 3514 del 05/09/2022 - Contratto del 12/09/2022 reg. n. 73 prot. n. 56684). - Liquidazione D.D. n.4633 del 04/11/2022 (Rif.Fatt. 5 del 13/10/2022 di € 9.885,24);Incarico relazione geologica e indagini geognostiche e ambientali alla D.ssa Rosalinda D’Ugo (D.D. affidamento n. 3785del 21/09/2022 - Contratto del 28/09/2022 reg. n. 79 prot. n. 61072) - Liquidazione acconto D.D. n. 728 del 16/02/2023 (Rif.Fatt. 1 del 02/02/2023 di € 5.404,61);-incarico coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione – affidamento diretto Ing.Francesco Russo (D.D. 2051 del 10/05/2024per complessive € 27.198,40 – Contratto del 17/05/2024 reg. n. 31 prot. n. 39378);- nomina collaudatore statico e tecnico amministrativo in corso d’opera all’Ing. Daniele Niosi – DD 2165 del 16/05/2024;- Incarico esecuzione rilievi topografici al geom. Pietro Melodia (D.D. affidamento n. 3513 del 05/09/2022 - Contratto del 12/09/2022 reg. n. 74 prot. n. 56687) - Liquidazione D.D. n. 500 del 06/02/2023 (Rif.Fatt. 1 del 30/01/2023 di € 14.173,33); Progettazione interna
M5C2I 2.2	D59D220000 30006	Riqualificazione del giardino storico settecentesco del complesso monumentale di Villa San Cataldo nel Comune di Bagheria (PA)	Adesione ad AQ Invalitalia per servizi tecnici: O.E. ICS srl (mandataria SAB srl, Mtstudio SRL NE.TEC srl (mandanti), e Appalto Integrato: IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A
M5C2I 2.2	D78H220001 80006	Progetto per la riqualificazione e trasformazione in campus scolastico polivalente ad indirizzo turistico alberghiero, del complesso immobiliare sito in Palermo via Ugo La Malfa , bene confiscato alla criminalità organizzata	Adesione ad AQ Invalitalia: - Servizi Tecnici: REACH STUDIO SRL + GEOVIT SRL; - Appalto integrato: AQ del 13/12/2023 - R.T.I. A.T.I. COSEDIL S.p.A. (Mandataria) – PAGANO S.p.A.” (Mandante) – Progettisti: T&A + EXNET srl; - Servizi di Verifica: PCQ srl; - Collaudo: dott. Ing. Antonio Turco - Studio Tecnico Carbonara Ingegneri Ass. - Studio Tecnico Chirilli Ingegneri Ass. Affidamento diretto MEPA: Incarico specialistico di consulenza per la progettazione architettonica ed impianti per la redazione del P.F.T.E. Ing. Dario Oliveri (D.D. n. 1115 del 10/03/2023) –
M5C2I 2.2	D79I2200015 0006	Facciamo Comunità	Affidamento diretto tramite MEPA Realizzazione attività previste dal Piano di Comunicazione alla Ditta DiGiTrend srl € 78.000; Adesione ad AQ Consip Intellera Consulting s.r.l., nq di Mandataria dell’RTI Intellera Consulting s.r.l., Almaviva the Italian Innovation Company S.p.A., Openknowledge s.r.l., Digit’ed S.p.A., Talent Garden Italia s.r.l € 723.840
M5C2I 2.2	D71C2200007 0006	Interventi di infrastrutturazione delle stazioni ferroviarie per favorire la multimodalità ecosostenibile del trasporto urbano	Affidamento Diretto Redazione del Progetto denominato Interventi di infrastrutturazione delle stazioni ferroviarie per favorire la multimodalità ecosostenibile del trasporto urbano RTP Arch. Maria Concetta Lo Porto – Ing. Ivan Torretta; - Procedura Negoziata Senza Bando Lavori del Progetto: RTI Impregida SRL capofila – Consorzio stabile Da Vinci mandante – LOGISS mandante;
M5C2I 2.2	D79E2200000 0006	Mobility As a Service per i Comuni dell’area metropolitana escluso Palermo	Trattativa diretta su Mepa con confronto fra preventivi: Servizio di redazione del progetto “Mobility As A Service per i comuni della Città metropolitana escluso Palermo”, di cui al Piano Integrato Urbano - supporto tecnico in fase di gara e di appalto - direzione dell’esecuzione del contratto: O.E. Bigo Solution S.r.l P.I 11950410016; - Trattativa diretta su MEPA “Riuso e personalizzazione alle esigenze del MAAS del sistema SICAT (per l’aggregazione dei dati degli operatori della mobilità e della Suite SVR di cui al Lotto 1 del MAAS” SISPI Sistema Palermo Innovazione SPA
M5C2I 2.2	D73C2200028 0006	Progetto di riqualificazione e riuso dell’immobile denominato Palazzetto Orlando , sito in Palermo corso Calatafimi, per l’utilizzo come centro polifunzionale a servizio delle Istituzioni scolastiche e del territorio	Adesione ad AQ Invalitalia per Servizi Tecnici (O.E. ICS srl (mandataria SAB srl, Mtstudio SRL NE.TEC srl (mandanti)) e Lavori (Edilzeta spa)
M4C1I 3.3	D95B1800095 0001	Lavori di messa in sicurezza dei prospetti dell’istituto e della palestra ed opere accessorie dell’ I.I.S. M. Picone in Alia (PA)	APPALTO LAVORI (Centrale committenza Direzione Gare e Contratti – procedura negoziata con inviti – OEV) “CANTIERI RIUNITI S.R.L.” P.IVA 02518290875 con sede in Catania; - Affidato con DD n. 4581 del 3/11/2022 Servizio di ingegneria ed architettura ed adeguamento ai requisiti del P.N.R.R. del progetto esecutivo relativo ai “Lavori di messa in sicurezza dei prospetti e della palestra ed opere accessorie nell’Istituto M. Picone di Alia (PA) all’ing. Salvatore Giordano – affidamento tramite piattaforma MEPA;

M4C1I 3.3	D77H210010 90001	Liceo Classico Umberto I di via Filippo Parlatore n. 26/c a Palermo. Progetto di Adeguamento sismico, manutenzione prospetti ed adeguamento degli impianti per l'ottenimento del C.P.I., rifacimento controsoffitti e sistemazione aree sportive esterne.	APPALTO INTEGRATO su Progetto Definitivo (Centrale committenza Direzione Gare e Contratti – procedura negoziata con 10 inviti): - B.F. Progetti Società di Ingegneria S.r.l. - Studio Tecnico Associato Mannelli Ginanni Andreini (Componente – mandante con P.Iva 01491010474) – Ing. Livi Sergio (componente – P.IVA 01957570474) D.D. n.4164 del 13/10/2022; -“Olimpia Costruzioni s.r.l.”
M4C1I 3.3	D55B1800154 0002	Progetto di riqualificazione ed Efficiamento energetico, rifunzionalizzazione degli spazi esterni, ristrutturazione, consolidamento e adeguamento dei locali e magazzino sottostanti il marciapiede a livello strada, rifacimento copertura corpo palestra del complesso I.T.C. Luigi Sturzo , via Sant'Ignazio di Loyola n. 7 in Bagheria (PA).Interventi su edificio palestra	APPALTO SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA (Centrale committenza Direzione Gare e Contratti – procedura negoziata con 5 inviti): BCS Costruzioni srl – P.I.: 02942960838; - D.D.G. 14665 DEL 14/11/2019 MIT Finanziamento progettazione definitiva – R.T.P. Sturzo (Arch. Davide rizzo mandatario) in esito al Decreto n.51 del 07/03/2022 è stato necessario provvedere alla rielaborazione della progettazione definitiva per le finalità del PNRR manifestazione di interesse e MEPA (OEV); - D.D. 6018 del 29/12/2022 affidamento progettazione esecutiva Siatec Ingegneria s.r.l. - contratto del 04/04/2023, avvio del 27/04/2023 manifestazione di interesse e MEPA (OEV)
M4C1I 3.3	D73F2000000 0001	I.T.I. Vittorio Emanuele III via Duca della Verdura (Palermo) - Interventi di miglioramento sismico del corpo aule e manutenzione straordinaria per il ripristino dell'agibilità della palestra	APPALTO INTEGRATO (Gare e Contratti – procedura ristretta 10 operatori) “Cofedil di Ferrante Giuseppe Mario” partita iva 04949150827; - servizio di ingegneria ed architettura F. Cacioppo e C. snc di Palermo A seguito di procedura negoziata (art. 36 D.Lgs 50/16) offerta economicamente più vantaggiosa DD 733 del 04/03/2021 – Successivo affidamento incarico per la rimodulazione del progetto definitivo allo Studio di ingegneria ed architettura ing. F. Cacioppo e C. snc di Palermo DD 4751 del 10/11/2022
M4C1I 3.3	D71B2100137 0001	Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico sede del Liceo Garibaldi di via Canonico Rotolo n. 2	APPALTO LAVORI (Centrale committenza Direzione Gare e Contratti – procedura negoziata con 5 inviti): IDROGEDIL srl – P.I.: 00276690823; - Affidamento diretto MEPA – Attività di Progettazione alla Società di ingegneria B.F. Progetti srl;
M4C1I 3.3	D71B2100136 0001	Realizzazione del nuovo corpo aule del Liceo Scientifico E. Basile di Palermo , via San Ciro n. 23, tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio 2	Società di ingegneria IF Consult di Vitale Francesco e Abbate salvatore snc per la redazione del PFTE - trattativa diretta n. 365783 – Affidamento diretto MEPA e affidamento con DD 3794 del 01/09/2023
M4C1I 3.3	D77H210011 10001	Liceo Linguistico Ninni Cassarà succursale di via Fattori n. 86 Palermo corpo principale. Lavori per l'adeguamento sismico, manutenzione prospetti, adeguamento impianti e sistemazione aree esterne	APPALTO SERVIZI PROGETTAZIONE (affidamento diretto a seguito di procedura negoziata – 3 operatori – MEPA – massimo ribasso): “Sidoti Engineering srl Unipersonale”
M4C1I 3.3	D35B1800090 0002	Liceo Classico E. Basile di Monreale (PA) Lotto di completamento e consolidamento.	Società di ingegneria IF Consult di Vitale Francesco e Abbate salvatore snc per la redazione del PFTE - trattativa diretta n. 365783 – Affidamento diretto MEPA e affidamento con DD 3794 del 01/09/2023
M4C1I 3.3	D55B1800151 0002	Liceo Classico F. Scaduto di Bagheria , Progetto di Consolidamento ed adeguamento alle vigenti normative di igiene abbattimento barriere architettoniche	APPALTO SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA (Centrale committenza Direzione Gare e Contratti – procedura negoziata con 10 inviti): Raggruppamento Temporaneo di Imprese “I.CO.SER s.r.l” (Capogruppo) - METAL PLASTIX s.r.l (Mandante); - D.D.G. 14665 DEL 14/11/2019 MIT Finanziamento progettazione definitiva - Litos s.r.l. in esito al Decreto n.51 del 07/03/2022 è stato necessario provvedere alla rielaborazione della progettazione definitiva per le finalità del PNRR D.D. 6018 del 29/12/2022 – manifestazione di interesse e MEPA (OEV); - D.D. 3808 DEL 04/09/2023 affidamento progettazione esecutiva Litos s.r.l. manifestazione di interesse e MEPA (OEV)
M4C1I 3.3	D75B1700219 0002	Istituto Magistrale Regina Margherita di Palermo Lavori di Adeguamento alle norme di sicurezza isigene e abbattimento barriere architettoniche.	Affidamento diretto MEPA servizio di ingegneria ed architettura per la realizzazione del PFTE alla società VE.MA Progetti s.r.l.s. con DD 5003 del 22/11/2022 - certificato di regolare esecuzione del servizio del 10/11/2023
M4C1I 3.3	D71B2100138 0001	Istituto Magistrale Regina Margherita succursale di via Casa Professa n.3 Palermo ex scuola Cascino progetto di ristrutturazione	APPALTO INTEGRATO su PFTE (commissione giudicatrice con UREGA – OEV): REPIN srl - P.I.: 03004880872; - Affidamento Servizi di Ingegneria per redazione progetto di fattibilità tecnica economica D.D. 2459 del 21/06/2022 manifestazione di interesse e MEPA; - Affidamento indagini Geosgrò servizi per la geologia con D.D. 546 del 02/02/2024 manifestazione di interesse e MEPA

7. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Alla luce degli esiti dell'attività istruttoria svolta e delle controdeduzioni rese dall'Ente, si rassegnano le seguenti conclusioni:

- la Città metropolitana di Palermo risulta essere soggetto attuatore di n. **28** progetti, per un ammontare complessivo di fondi del PNRR e del PNC pari ad euro **104.764.663,77** e un importo totale comprensivo di risorse dell'Ente e di altri fondi pubblici pari ad euro **9.703.207,01**.

Il **48,50** per cento dei fondi complessivi si concentra nella missione M5 (*"Inclusione e coesione"*), il **38,59** per cento nella missione M4 (*"Istruzione e ricerca"*), il **12,46** per cento nella missione M2 e lo **0,45** per cento nella missione M1 (*"Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"*).

Il maggior numero di progetti è detenuto dalla missione M4 (*"Istruzione e ricerca"*), pari al **39,28** per cento dei CUP.

- Pe quanto attiene al cronoprogramma procedurale, alla data del 30/06/2024, risulta che:
 - per il 36 per cento dei progetti, era prevista la conclusione della fase di *"Avvio"*;
 - per il 14 per cento dei progetti, era prevista la conclusione della fase di *"Aggiudicazione"*;
 - per il 43 per cento dei progetti, era prevista la conclusione della fase di *"Stipula contratto"*;
 - per il 7 per cento dei progetti, era prevista la conclusione della fase di *"Esecuzione lavori o fornitura bene/servizio"*.

Alla data del 30/06/2024, come da tabella riepilogativa n. 10 (in calce alla relazione), il **29** per cento dei CUP è allineato al cronoprogramma procedurale (n. **8** progetti).

Si rileva il ritardo rispetto al cronoprogramma procedurale di n. **10** progetti identificati coi seguenti n. CUP:

- D77H21001110001;
- D71B21001370001;
- D73F20000000001;
- D55B18001540002;
- D77H21001090001;
- D55B18001510002;
- D71B21001380001;
- D63G22000020006;
- D59D22000030006;
- D78H22000180006.

Per n. **10** progetti (v. tab. 4), non è stato possibile accertarne il relativo allineamento/disallineamento al 30/06/2024, rispetto al cronoprogramma procedurale, non avendo l'Ente fornito risposte puntuali alle richieste istruttorie.

Si rileva, inoltre, in riferimento agli stessi progetti, una discordanza tra i dati resi dall'Ente in sede istruttoria e di controdeduzioni e quelli che l'Ente ha inserito nella piattaforma ReGiS.

- Per quanto riguarda l'avanzamento finanziario, la Sezione ha potuto verificare una percentuale di risorse accertate, al 31/12/2023, pari al **53** per cento del finanziamento totale ed una percentuale di anticipazioni pari all'**11** per cento del finanziamento complessivo. I pagamenti totali sono pari ad euro **1.555.307,45** ossia il **3** per cento dei fondi accertati.
- I progetti coinvolti nella rimodulazione del costo iniziale sono n. **16** progetti, per un importo pari ad euro **72.081.512,34** ovvero il 69 per cento della somma dei fondi RRF e PNC pari ad euro **104.764.663,77**.

Per quanto attiene al cronoprogramma procedurale di questi interventi, alla data del 30/06/2024, risulta che, per il **18,75** per cento dei progetti, era prevista la conclusione della fase di "*Avvio*", per il **6,25** per cento dei progetti, la conclusione della fase di "*Aggiudicazione*", per il **62,5** per cento dei progetti, la fine della fase di "*Stipula contratto*" e, per il **12,5** per cento dei progetti, era previsto il termine della fase di "*Esecuzione lavori e/o fornitura beni/servizi*".

Sono emersi ritardi nel caso di n. **9** progetti ovvero il **56** per cento dei CUP rimodulati.

Per un progetto rimodulato, non è stato possibile accertarne il relativo allineamento/disallineamento, al 30/06/2024, rispetto al cronoprogramma procedurale, non avendo l'Ente fornito risposte puntuali alle richieste istruttorie.

N. **5** progetti coinvolti dalla rimodulazione sono stati considerati meritori del contributo statale per le opere indifferibili (FOI), per un ammontare pari ad euro 3.179.550,00.

- L'Ente risulta beneficiaria di n. **48** progetti (v. tab. 8), ricompresi nella linea di intervento M5C2I2.2 "*Piani Urbani Integrati*", per un ammontare complessivo pari ad euro 146.641.637,84, la cui attuazione è in capo a diversi enti ricompresi nell'area metropolitana.
- Ai fini dell'attuazione di n. **6** progetti, l'Ente si è avvalso di un ente strumentale, nello specifico di Invitalia, nella qualità di centrale di committenza.

- In riferimento all'attuazione e alla rendicontazione dei progetti PNRR/PNC, l'Ente ha riscontrato difficoltà dovute, in diversi progetti, a carenze di personale.

Tabella 9- Elenco progetti PNRR/PNC di cui la Città metropolitana di Palermo è soggetto attuatore

Missione	Missione - Componente - Investimento	CUP	Denominazione progetto	Totale finanziamento
M1	M1C3I1.2	D77B23000150006	Loggiato dell'ex ospedale San Bartolomeo - Palermo - corso Vittorio Emanuele - Rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali	499.894,26
M1	M1C1I1.4.4	D744123000000006	Identità digitale Spid/CIE estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitali - SPID CIE	14.000,00
M2	M2C4I3.1	D28E2000150006	"PA01 FORESTE CORLEONESI" PNRR M2C4 INV. 3.1 "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO"	2.032.031,58
M2	M2C4I3.1	D98E22000270006	"PA02 FORESTAZIONE MONTASPRO" PNRR M2C4 INV. 3.1 "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO"	4.217.110,56
M2	M2C4I3.1	H82F23000270006	PA01-2023 Forestazione Belmonte	3.898.393,89
M2	M2C4I3.1	G92F23000340006	PA02-2023 Forestazione Marineo	685.740,00
M2	M2C4I3.1	C22F23000280006	PA03-2023 Proposta progettuale finalizzata alla realizzazione di interventi di forestazione urbana , periurbana ed extraurbana nel contesto territoriale della Città Metropolitana di Palermo nell'ambito del PNRR	910.484,97
M2	M2C4I3.1	H82F23000300006	PA05-2023 Forestazione Belmonte 2	2.520.984,15
M4	M4C1I3.3	D35B18000900002	Liceo Classico E. Basile di Monreale (PA) Lotto di completamento e consolidamento.	2.351.800,00
M4	M4C1I3.3	D77H21001110001	Liceo Linguistico Ninni Cassarà succursale di via Fattori n. 86 Palermo corpo principale. Lavori per l'adeguamento sismico, manutenzione prospetti, adeguamento impianti e sistemazione aree esterne	3.836.420,00
M4	M4C1I3.3	D71B21001360001	Realizzazione del nuovo corpo aule del Liceo Scientifico E. Basile di Palermo, via San Ciro n. 23, tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio 2	7.500.000,00
M4	M4C1I3.3	D71B21001370001	Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico sede del Liceo Classico G. Garibaldi di via Canonico Rotolo n. 2	1.353.000,00
M4	M4C1I3.3	D73F20000000001	I.T.I. Vittorio Emanuele III° via Duca della Verdura (Palermo) - Interventi di miglioramento sismico del corpo aule e manutenzione straordinaria per il ripristino dell'agibilità della palestra.	4.156.325,00
M4	M4C1I3.3	D55B18001540002	Progetto di riqualificazione ed efficientamento energetico, rifunzionalizzazione degli spazi esterni, ristrutturazione, consolidamento e adeguamento dei locali e magazzino sottostanti il marciapiede a livello strada, rifacimento copertura corpo palestra del complesso I.T.C. Luigi Sturzo , via Sant'Ignazio di Loyola n. 7 in Bagheria (PA). Interventi su edificio palestra.	1.240.000,00
M4	M4C1I3.3	D77H21001090001	Liceo Classico Umberto I di via Filippo Parlatore n. 26/c a Palermo. Progetto di adeguamento sismico, manutenzione prospetti ed adeguamento degli impianti per l'ottenimento del C.P.L., rifacimento controsoffitti e sistemazione aree sportive esterne.	3.424.000,00
M4	M4C1I3.3	D95B18000950001	Lavori di messa in sicurezza dei prospetti dell'istituto e della palestra ed opere accessorie dell' I.I.S. M. Picone in Alia (PA)	2.456.349,71
M4	M4C1I3.3	D55B18001510002	Liceo Classico "E. Scaduto", di Bagheria (PA) - Progetto di consolidamento ed adeguamento alle vigenti normative di igiene, abbattimento barriere architettoniche e sicurezza, miglioramento dell'efficienza energetica del complesso scolastico e sistemazione aree sportive esterne	2.700.000,00
M4	M4C1I3.3	D75B17002190002	Adeguamento alle norme vigenti e restauro dell' Istituto Magistrale R. Margherita di Palermo. Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, igiene e abbattimento barriere architettoniche, recupero funzionale e restauro (II° intervento funzionale)	5.000.000,00
M4	M4C1I3.3	D71B21001380001	Istituto Magistrale Regina Margherita, succursale di via Casa Professa n. 3 in Palermo (ex scuola Cascino). Progetto di ristrutturazione tramite demolizione e ricostruzione del plesso scolastico	8.500.000,00
M5	M5C2I2.2.C	D63G2200020006	Intervento di riqualificazione funzionale ed efficientamento energetico degli immobili esistenti nel comprensorio denominato Floriopoli territorio di Termini Imerese	6.083.650,00
M5	M5C2I2.2.C	D23I22000000006	Riqualificazione ed efficientamento energetico della struttura alberghiera Vincenzina La Fata e del centro tecnico Vito Ales di Piana degli Albanesi.	2.085.000,00
M5	M5C2I2.2.C	D25B22000030006	Realizzazione di un parco con percorsi natura nelle aree di pertinenza del centro tecnico di canoa e canottaggio Vito Ales nel bacino artificiale di Piana degli Albanesi.	2.185.000,00
M5	M5C2I2.2	D59D22000030006	Riqualificazione del giardino storico settecentesco del complesso monumentale di Villa San Cataldo nel Comune di Bagheria (PA).	5.330.000,00
M5	M5C2I2.2.C	D78H22000180006	Progetto per la riqualificazione e trasformazione in campus scolastico polivalente ad indirizzo turistico alberghiero, del complesso immobiliare sito in Palermo via Ugo La Malfa , bene confiscato alla criminalità organizzata.	27.836.000,00
M5	M5C2I2.2	D79I22000150005	Acquisto Servizi per la P.A. e la Collettività	1.800.654,16
M5	M5C2I2.2	D71C22000070006	Interventi di infrastrutturazione delle stazioni ferroviarie per favorire la multimodalità ecosostenibile del trasporto urbano.	2.370.000,00
M5	M5C2I2.2	D79E22000000006	MOBILITY AS A SERVICE PER I COMUNI DELL'AREA METROPOLITANA ESCLUSO PALERMO	1.845.000,00
M5	M5C2I2.2	D73C22000280006	Progetto di riqualificazione e riuso dell'immobile denominato Palazzetto Orlando , sito in Palermo corso Calatafimi, per l'utilizzo come centro polifunzionale a servizio delle istituzioni scolastiche e del territorio.	5.984.000,00

Fonte: elaborazioni Cdc sulla base del riscontro istruttorio e delle controdeduzioni dell'Ente

Tabella 10 - Elenco progetti PNRR/PNC della Città metropolitana di Palermo con indicazione ultima fase procedurale in scadenza al 30/06/2024 e relativo allineamento/disallineamento

Missione	Missione - Componente - Investimento	CUP	Denominazione progetto	Fase procedurale con scadenza, da cronoprogramma, entro il 30/06/2024	Data fine prevista	Data fine effettiva	CUP in linea con cronoprogramma (si/no)
M1	M1C3I1.2	D77B23000150006	Loggiato dell'ex ospedale San Bartolomeo - Palermo - corso Vittorio Emanuele - Rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali	Monitoraggio progetto (in avvio)	30/06/2024	30/06/2024	si
M1	M1C1I1.4.4	D744123000000006	Identità digitale Spid/CIE estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitali - SPID CIE	Predisposizione capitolato e bando di gara (in avvio)	16/07/2024	N.d.	
M2	M2C4I3.1	D28E2000150006	"PA01 FORESTE CORLEONESI" PNRR M2C4 INV. 3.1 "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO"	Esecuzione	31/12/2026	N.d.	
M2	M2C4I3.1	D98E22000270006	"PA02 FORESTAZIONE MONTASPRO" PNRR M2C4 INV. 3.1 "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO"	Esecuzione	31/12/2026	N.d.	
M2	M2C4I3.1	H82F23000270006	PA01-2023 Forestazione Belmonte	PFTE (progetto di fattibilità tecnico economica) (in avvio)	30/08/2024	N.d.	
M2	M2C4I3.1	G92F23000340006	PA02-2023 Forestazione Marineo	PFTE (progetto di fattibilità tecnico economica) (in avvio)	30/10/2024	N.d.	
M2	M2C4I3.1	C22F23000280006	PA03-2023 Proposta progettuale finalizzata alla realizzazione di interventi di forestazione urbana , periurbana ed extraurbana nel contesto territoriale della Città Metropolitana di Palermo nell'ambito del PNRR	PFTE (progetto di fattibilità tecnico economica) (in avvio)	30/10/2024	N.d.	
M2	M2C4I3.1	H82F23000300006	PA05-2023 Forestazione Belmonte 2	PFTE (progetto di fattibilità tecnico economica) (in avvio)	30/08/2024	N.d.	
M4	M4C1I3.3	D35B18000900002	Liceo Classico E. Basile di Monreale (PA) Lotto di completamento e consolidamento.	Stipula contratto	08/11/2023	08/11/2023	si
M4	M4C1I3.3	D77H21001110001	Liceo Linguistico Ninni Cassarà succursale di via Fattori n. 86 Palermo corpo principale. Lavori per l'adeguamento sismico, manutenzione prospetti, adeguamento impianti e sistemazione aree esterne	Stipula contratto	15/06/2023	N.d.	no
M4	M4C1I3.3	D71B21001360001	Realizzazione del nuovo corpo aule del Liceo Scientifico E. Basile di Palermo, via San Ciro n. 23, tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio 2	Monitoraggio progetto (in avvio)	N.d.	N.d.	
M4	M4C1I3.3	D71B21001370001	Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico sede del Liceo Classico G. Garibaldi di via Canonico Rotolo n. 2	Stipula contratto	12/04/2024	22/04/2024	no
M4	M4C1I3.3	D73F20000000001	I.T.I. Vittorio Emanuele III° via Duca della Verdura (Palermo) - Interventi di miglioramento sismico del corpo aule e manutenzione straordinaria per il ripristino dell'agibilità della palestra.	Stipula contratto	15/04/2024	30/05/2024	no

M4	M4C1I3.3	D55B18001540002	Progetto di riqualificazione ed efficientamento energetico, rifunionalizzazione degli spazi esterni, ristrutturazione, consolidamento e adeguamento dei locali e magazzino sottostanti il marciapiede a livello strada, rifacimento copertura corpo palestra del complesso L.T.C. Luigi Sturzo, via Sant'Ignazio di Loyola n. 7 in Bagheria (PA). Interventi su edificio palestra.	Stipula contratto	30/04/2024	03/05/2024	no
M4	M4C1I3.3	D77H21001090001	Liceo Classico Umberto I di via Filippo Paulatore n. 26/c a Palermo. Progetto di adeguamento sismico, manutenzione prospetti ed adeguamento degli impianti per l'ottenimento del C.P.I., rifacimento controsoffitti e sistemazione aree sportive esterne.	Stipula contratto	15/04/2024	29/05/2024	no
M4	M4C1I3.3	D95B18000950001	Lavori di messa in sicurezza dei prospetti dell'istituto e della palestra ed opere accessorie dell'I.I.S. M. Picone in Alia (PA)	Stipula contratto	24/11/2023	24/11/2023	si
M4	M4C1I3.3	D55B18001510002	Liceo Classico "F. Scaduto", di Bagheria (PA) - Progetto di consolidamento ed adeguamento alle vigenti normative di igiene, abbattimento barriere architettoniche e sicurezza, miglioramento dell'efficienza energetica del complesso scolastico e sistemazione aree sportive esterne	Stipula contratto	03/04/2024	12/06/2024	no
M4	M4C1I3.3	D75B17002190002	Adeguamento alle norme vigenti e restauro dell'Istituto Magistrale R. Margherita di Palermo. Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, igiene e abbattimento barriere architettoniche, recupero funzionale e restauro (II° intervento funzionale)	Monitoraggio progetto (in avvio)	N.d.	N.d.	
M4	M4C1I3.3	D71B21001380001	Istituto Magistrale Regina Margherita, succursale di via Casa Professa n. 3 in Palermo (ex scuola Cascino). Progetto di ristrutturazione tramite demolizione e ricostruzione del plesso scolastico	Stipula contratto	30/04/2024	N.d.	no
M5	M5C2I2.2.C	D63G22000020006	Intervento di riqualificazione funzionale ed efficientamento energetico degli immobili esistenti nel comprensorio denominato Floriopoli territorio di Termini Imerese	Aggiudicazione	30/01/2023	07/08/2023	no
M5	M5C2I2.2.C	D23I22000000006	Riqualificazione ed efficientamento energetico della struttura alberghiera Vincenzina La Fata e del centro tecnico Vito Ales di Piana degli Albanesi.	Stipula contratto	15/04/2024	03/04/2024	si
M5	M5C2I2.2.C	D25B22000030006	Realizzazione di un parco con percorsi natura nelle aree di pertinenza del centro tecnico di canoa e canottaggio Vito Ales nel bacino artificiale di Piana degli Albanesi.	Stipula contratto	30/03/2024	20/03/2024	si
M5	M5C2I2.2	D59D22000030006	Riqualificazione del giardino storico settecentesco del complesso monumentale di Villa San Cataldo nel Comune di Bagheria (PA).	Progettazione definitiva - Conferenza Servizi Decisoria (in avvio)	10/11/2023	13/03/2024	no
M5	M5C2I2.2.C	D78H22000180006	Progetto per la riqualificazione e trasformazione in campus scolastico polivalente ad indirizzo turistico alberghiero, del complesso immobiliare sito in Palermo via Ugo La Malfa, bene confiscato alla criminalità organizzata.	Stipula contratto	28/06/2024	N.d.	no
M5	M5C2I2.2	D79I22000150005	Acquisito Servizi per la P.A. e la Collettività	Aggiudicazione	30/07/2023		si
M5	M5C2I2.2	D71C22000070006	Interventi di infrastrutturazione delle stazioni ferroviarie per favorire la multimodalità ecosostenibile del trasporto urbano.	Aggiudicazione	30/07/2023		si
M5	M5C2I2.2	D79E22000000006	MOBILITY AS A SERVICE PER I COMUNI DELL'AREA METROPOLITANA ESCLUSO PALERMO	Aggiudicazione	30/07/2023		si
M5	M5C2I2.2	D73C22000280006	Progetto di riqualificazione e riuso dell'immobile denominato Palazzetto Orlando, sito in Palermo corso Calatafimi, per l'utilizzo come centro polifunzionale a servizio delle istituzioni scolastiche e del territorio.	Progettazione Definitiva - Esecutiva (in avvio)	31/07/2024	N.d.	

Fonte: elaborazioni Cdc sulla base del riscontro istruttorio e delle controdeduzioni dall'Ente

